

Liberty - Gainesville 16"

Task Name	Start Date	End Date	% Complete
Gainesville 16"	12/27/24	09/14/27	20%
Project Initiation	12/27/24	01/06/25	100%
Phase 1	12/30/24	01/01/26	62%
Engineering Design Phase I	12/30/24	06/12/25	98%
Site Visit	02/04/25	02/06/25	100%
Survey	12/30/24	01/15/25	100%
30% Design	01/07/25	02/25/25	100%
Cathodic Protection Design	02/13/25	04/25/25	100%
Geotech	03/03/25	04/25/25	100%
60% Design	02/07/25	03/14/25	100%
90% Design	03/17/25	04/16/25	100%
IFC Submittal	04/17/25	06/12/25	91%
Local Permitting	02/11/25	07/01/25	91%
Environmental Permitting	02/04/25	06/10/25	100%
Material Procurement	01/20/25	11/20/25	41%
Land Acquisition Phase 1	03/17/25	07/21/25	75%
Construction RFP Process - Phase 1	03/17/25	06/03/25	100%
Phase 1 Construction	06/05/25	01/01/26	1%
Phase 2 and 3	06/04/25	09/14/27	1%
Survey Phase 2 & 3	06/12/25	09/18/25	1%
Land Acquisition Phase 2 and 3	06/12/25	05/14/26	1%
Engineering Design Phase 2 and 3	06/04/25	12/30/25	12%
Site Visit	06/04/25	06/04/25	100%
30% Design	06/05/25	07/09/25	0%
Cathodic Protection Design	07/10/25	08/27/25	73%
Geotech	07/10/25	09/10/25	0%
60% Design	07/10/25	09/16/25	0%
90% Design	09/17/25	11/04/25	0%
IFC Submittal	11/05/25	12/30/25	0%
Local Permitting	06/26/25	02/25/26	0%
Environmental Permitting	06/23/25	01/14/26	0%
Material Procurement Phase 2	01/05/26	10/06/26	0%
Material Procurement Phase 3	10/12/26	06/21/27	0%
Construction RFP Process - Phase 2	03/13/26	05/19/26	0%
Phase 2 Construction	06/03/26	11/18/26	0%
Construction RFP Process - Phase 3	12/31/26	03/08/27	0%
Phase 3 Construction	03/30/27	09/14/27	0%

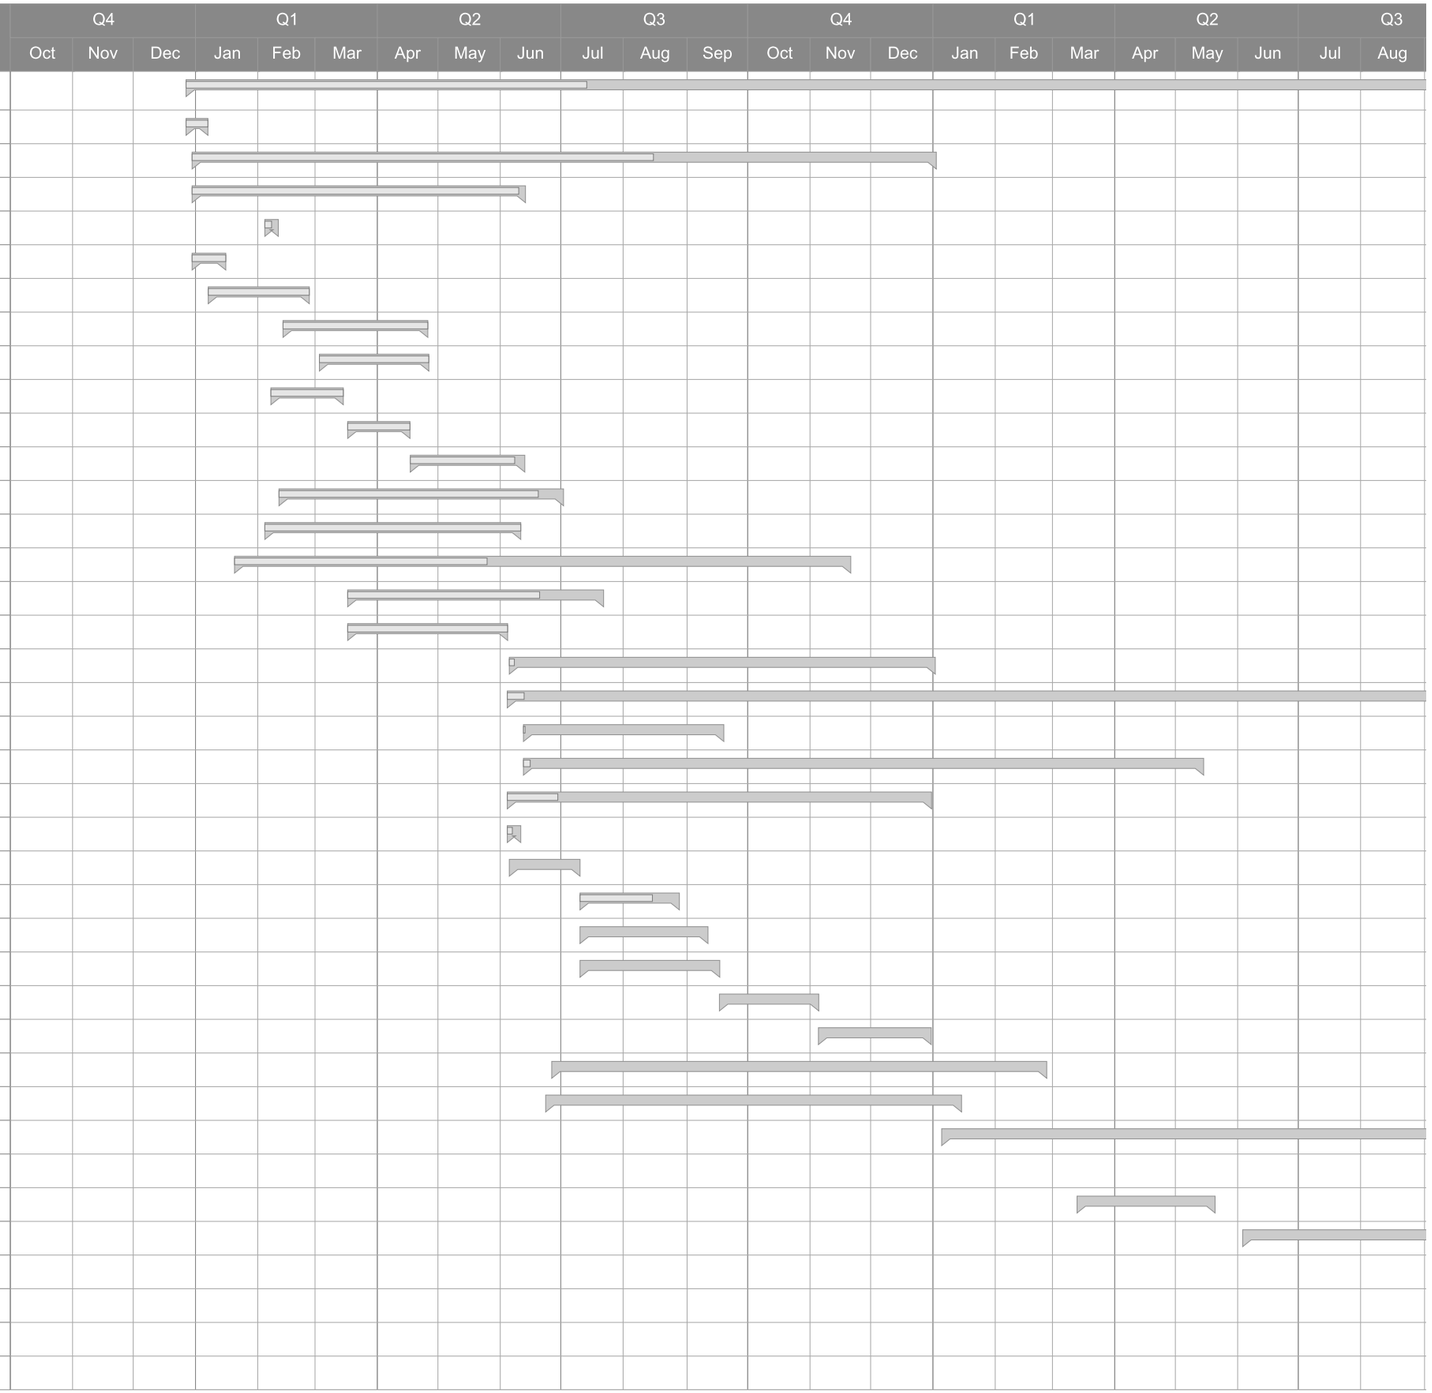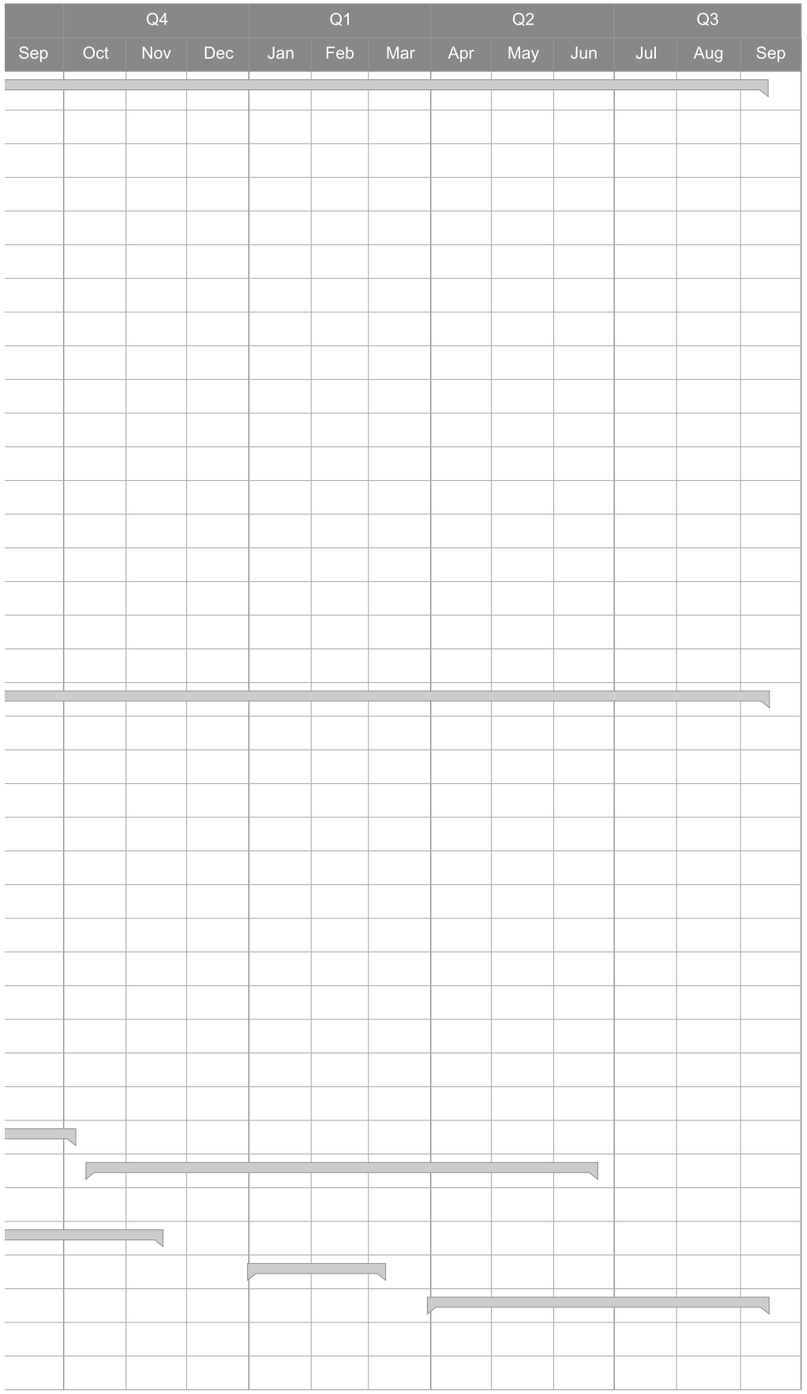


Q4
Q1
Q2
Q3
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
